

竣工环境保护自行验收意见

一、工程建设基本情况

该项目环境影响报告表由江苏省设备成套有限公司编制，2011年7月7日经淮安市淮安生态环境局（原淮安市楚州区环境保护局）审批通过，该项目现已建成投运。污水处理工艺流程见图1。

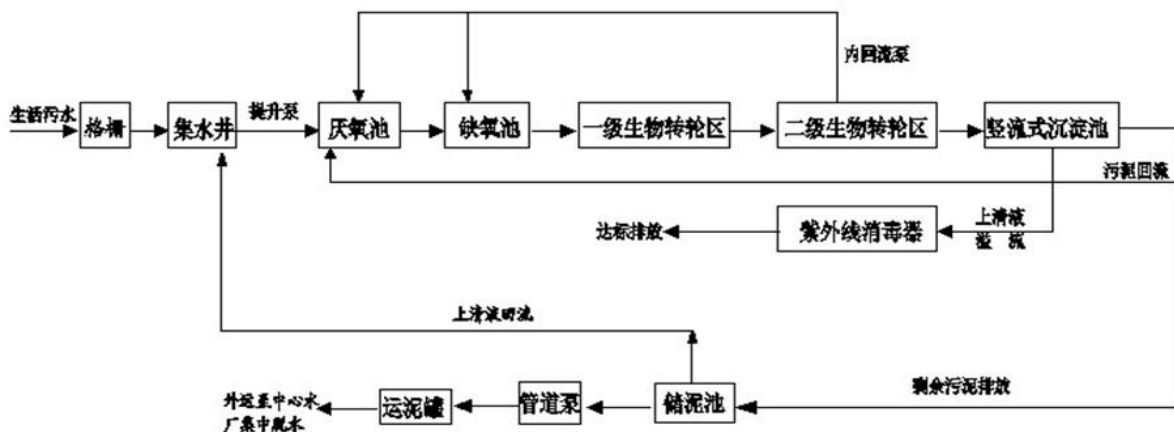


图 1 污水处理工艺流程图

项目设备清单见表 1。

表 1 主要设备一览表

| 序号 | 原环评设备 | | | 实际建设情况 | | |
|----|----------|---|-------------|----------|--|-------------|
| | 名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 名称 | 规格 | 数量 (台/套) |
| 1 | 不锈钢格栅 | B=0.65m, e=10m, N=0.7kw | 1 | 提篮不锈钢格栅 | ZTG-100-3 N=0.75kw | 1 |
| 2 | 潜污泵 | Q=25m ³ /h, H=8m, N=1.5kw | 2 | 潜污泵 | 65WQ25-15-2.2, Q=25m ³ /h, H=15m, N=2.2KW | 2 |
| 3 | 液位控制系统 | 浮球式 | 1 | 液位计 | WY-P1, 0-5m | 1 |
| 4 | 流量计 | 管道式 | 1 | 流量计 | 口径为 DN65, 测量 范围 Q=0-25m ³ /h | 1 |
| 5 | 细格栅 | e=5mm, 非标 | 2 | 细格栅 | 非标 | 1 |
| 6 | 曝气系统 | 非标 | 4 | 生物转轮曝气系统 | BR4.6x3.0 3KW | 2 |
| 7 | 沉淀池布水系统 | 非标 | 1 | 沉淀池布水系统 | Q500 | 1 |
| 8 | 沉淀池出水系统 | 非标 | 1 | 沉淀池出水系统 | Q500 | 1 |
| 9 | 排泥泵 | Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75kW | 2 | 排泥泵 | Q=12m ³ /h, H=8m, 0.75KW | 2 |
| 10 | 潜水搅拌机 | N=0.37kw | 1 | 潜水搅拌机 | 740rpm、N=0.85KW | 3 |
| 11 | 在线 pH 计 | / | 2 | 在线 pH 计 | PR308 | 2 |
| 12 | 在线 DO 仪 | / | 2 | 在线 DO 仪 | CM442 | 1 |
| 13 | 在线 ORP 仪 | / | 1 | 在线 ORP 仪 | / | 1 |
| 14 | 组合填料 | H=2m | 120 | 组合填料 | / | 1 |
| 15 | 填料支架 | 非标 | 1 | 填料支架 | / | 1 |
| 16 | 微孔曝气器 | / | 1 | 微孔曝气器 | / | 1 |
| 17 | 回流泵 | Q=25m ³ /h, H=8m, N=1.5kw | 2 | 内回流泵 | Q=80m ³ /h, H=1m, 1.1KW | 2 |
| | | | | 外回流泵 | Q=12m ³ /h, H=8m, 0.75KW | 2 |
| | | | | 加药除磷系统 | DN25, 1.1m/h, 0.18kw, 加药罐: | 1 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|---|-------------|--|---|
| | | | | | 1000mL | |
| 18 | 鼓风机 | Q=3.18m ³ /min, P=50KPa, N=4.0kw | 2 | 鼓风机 | Q=3.18m ³ /min, P=50KPa, N=4.0kw | 2 |
| 19 | 紫外消毒 系统 | 非标 | 1 | 紫外消毒 系统 | ZL-500 | 1 |
| 20 | 巴歇尔槽 | / | 1 | 巴歇尔槽 | 30L/h | 1 |
| 21 | 超声流量 计 | / | 1 | 超声流量 计 | XF600M | 1 |
| 22 | 中心传动 浓缩机 | D=3.1m, N=0.37kw | 1 | 中心传动 浓缩机 | D=3.1m, N=0.37kw | 1 |
| 23 | 气动隔膜 泵 | VA50 | 2 | 气动隔膜 泵 | VA50 | 2 |
| 24 | 空压机 | N=3.0kw, P=0.8MPa | 1 | 自曝气生 物转轮 | / | 2 |
| 25 | 板框压滤 机 | 40m ² | 1 | 电控系统 | / | 1 |
| 26 | 电控系统 | / | 1 | 电控系统 | / | 1 |

项目主要构筑物见表 2。

表 2 主要构筑物表

| 序 号 | 环评情况 | | | 实际建设情况 | | |
|--------|--------|---------------|-----|--------|---------------|-----|
| | 名称 | 主要尺寸 | 数量 | 名称 | 主要尺寸 | 数量 |
| 1 | 格栅渠 | 1.5×5.0×3.0m | 1 座 | 格栅井 | 4.0×2.0×6.1m | 1 座 |
| 2 | 集水池 | 5.0×8.0×4.0m | 1 座 | 集水池 | 4.5×6.0×6.1m | 1 座 |
| 3 | 预缺氧池 | 1.5×5.0×5.0m | 1 座 | 厌氧池 | 3.0×2.7×5.24m | 1 座 |
| 4 | 厌氧池 | 5.0×5.0×5.0m | 1 座 | 缺氧池 | 3.5×3.0×5.24m | 1 座 |
| 5 | 缺氧池 | 3.0×5.0×5.0m | 1 座 | 一级转轮区 | 6.0×3.5×5.24m | 1 座 |
| 6 | 好氧池 | 10.0×4.5×5.0m | 1 座 | 二级转轮区 | 6.0×3.5×5.24m | 1 座 |
| 7 | 二沉池 | Φ7×5.5m | 1 座 | 竖流沉淀池 | 5.4×5.4×6.24m | 1 座 |
| 8 | 消毒、排放池 | 2.0×3.0×3.0m | 1 座 | 出水渠 | 4.5×0.6×0.7m | 1 座 |
| 9 | 污泥池 | Φ3×5.5m | 1 套 | 污泥池 | 3.0×3.1×5.24m | 1 套 |
| 10 | 设备间 | 8×6m | 1 座 | 设备间 | 8.5×4.5m | 1 座 |
| 11 | 综合用房 | 12×8m | 1 座 | 值班室 | 4.5×4.8m | 1 座 |

公辅工程如表 3 所示。

表 3 项目公用及辅助工程表

| 类别 | 建设内容 | 设计能力 (环评要求) | 实际建设情况 |
|------|------|-------------------|-----------------------|
| 公用工程 | 给水 | 550t/a, 自来水管网 | 550t/a, 自来水管网 |
| | 排水 | 500t/d, 排入白马湖下游引河 | 500t/d, 排入白马湖下游引河 |
| | 供电 | 市政电网 | 市政电网 |
| 环保工程 | 废气治理 | 污水处理设施加盖 | 厂区厂界种植绿化 |
| | 噪声治理 | 隔声、吸声 | 高噪声设备置于室内, 建筑物隔声、绿化吸声 |
| | 固废 | 污泥暂存池 | 污泥暂存池、危废库 |

(二) 建设过程及环保审批情况

表 4 项目环保审批及建设过程情况

| 序号 | 类型 | 执行情况 |
|----|------------|---|
| 1 | 备案 | 2011 年 5 月 9 日, 原淮安市楚州区发展和改革委员会, 楚发改审字[2011]95 号。 |
| 2 | 环评 | 2011 年 5 月, 江苏省设备成套有限公司, 《南闸镇污水处理厂项目环境影响报告表》。 |
| 3 | 环评批复 | 2011 年 7 月 7 日, 原淮安市楚州区环境保护局, 审批意见。 |
| 4 | 本次验收项目建设规模 | 污水处理规模 500t/d。 |
| 5 | 环保工程 | 废气: 厂区厂界种植绿化; 噪声: 高噪声设备置于室内, 建筑物隔声、绿化吸声; 固废: 污泥储存池、危废库。 |

(三) 投资情况

项目总投资 300 万元, 其中环保投资为 27 万元, 占总投资的 9%。

(四) 验收范围

项目环评报告及其批复规定的与建设项目有关的污染防治措施。

二、工程变动情况

1、变动内容：

(1)原环评报告分析，污水处理工艺为格栅-沉砂池-初沉池-预缺氧池-厌氧池-缺氧池-好氧池-二沉池-消毒池处理后排放；

实际生产中，污水处理工艺为格栅-集水井-厌氧池-缺氧池-一级生物转轮区-二级生物转轮区-竖流式沉淀池-消毒池处理后排放，变更了生物转轮设施及配套设备。

(2)原环评报告分析，固废为生活垃圾、格栅栅渣、污泥，污泥收集后送填埋场填埋处理，格栅栅渣、生活垃圾环卫清运；

实际生产中，固废为生活垃圾、格栅栅渣、污泥、在线设备产生的实验室废液，污泥外运淮安市同兴新型环保建材有限公司生产制砖，格栅栅渣生活垃圾环卫清运，在线设备产生的实验室废液委托淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司收集处理。

2、变动结论：

通过分析，工程实际建设情况基本与原环评保持一致，主要变动为废水处理工艺改变，固废增加在线设备产生的实验室废液。项目废气处理措施、风险防范措施均未发生变化，废气、废水污染物排放总量均不变。

本次变动对照江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办环[2021]122号）及附件、生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）文件，本公司此次的变动不属于重大变动，属于一般变动，纳入竣工环境保护验收管理。

项目与重大变动清单对比情况见表5。

表5 项目与重大变动清单对比表

| 序号 | 类型 | 重大变动清单内容 | | 原环评情况 | 实际情况 | 变动情况 | 是否属于重大变动 |
|----|------|---|----------------------------|---|-----------------------|------|----------|
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | | 新建，污水收集处理 | 新建，污水收集处理 | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上 | | 处理能力为500t/d | 处理能力为500t/d | 无变化 | 否 |
| 3 | | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | | 处理能力未增大 | | 无变化 | |
| 4 | | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | | 项目无二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物排放，废水污染物排放量不变 | | 无变化 | |
| 5 | 地点 | 项目重新选址： | | 淮安市楚州区南闸镇新河头居委会南闸片姚庄组 | 淮安市淮安区漕运镇新河头居委会南闸片姚庄组 | 无变化 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃 | 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 废气污染物主要为氨、硫化氢 | 废气污染物主要为氨、硫化氢 | 无变化 | 否 |
| | | | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 | 项目污染物排放量不变 | | 无变化 | |
| | | | 废水第一类污染物排放量增加的 | 废水排放量及污染物排放量不变 | | 无变化 | |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------------|---|---|---------|
| | | | 其他污染物排放量增加 10%及以上的 | | | |
| | | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | | 本项目储存量不变，储存方式不变 | | 不变 |
| 7 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | | 废水处理措施为格栅-沉砂池-初沉池-预缺氧池-厌氧池-缺氧池-好氧池-二沉池-消毒池；无组织废气排放量为硫化氢 0.005 吨、氨 0.03 吨。 | 废水处理措施为格栅-集水井-厌氧池-缺氧池-一级生物转轮区-二级生物转轮区-竖流式沉淀池-消毒池处理，无组织废气排放量为硫化氢 0.005 吨、氨 0.03 吨。 | 废气排放量不变 |
| | | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | | 废水无新增排放口，废水排放量不变 | | 无变化 |
| | | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。 | | 废气无排放口，一个废水排放口、一个雨水排放口 | 废气无排放口，一个废水排放口、一个雨水排放口 | 无变化 |
| | | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | | 噪声：低噪音设备、消声减振措施 | 噪声：低噪音设备、消声减振措施 | 无变化 |
| | | 土壤和地下水要求污水处理池、管道、场地等进行防渗漏措施 | 污水处理池、管道、场地等已按照要求进行防渗漏措施 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|---------|--|
| | | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 污泥收集后送填埋场填埋处理，格栅栅渣、生活垃圾环卫清运 | 污泥外运淮安市同兴新型环保建材有限公司生产制砖，格栅栅渣生活垃圾环卫清运，在线监测设备产生的实验室废液委托淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司收集处理 | 环境影响未加重 | |
| | | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 无 | 无 | 无变化 | |

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

针对污水处理厂产生的无组织恶臭，在厂区厂界种植绿化，减轻恶臭对周边环境的影响。

（二）废水

项目废水主要为接管废水及新增少量生活污水，一并经污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 B 标准后，排入白马湖下游引河。污水处理工艺流程见图 1。

（三）噪声

(1)选择低噪声设备，利用绿化吸声；

(2)高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声降噪；

(3)加强管理，加强对噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

（四）固废

运营过程产生的固废为生活垃圾、格栅栅渣、污泥、在线设备产生的实验室废液。

污泥：用密闭槽罐车运输到淮安区城镇污水处理厂污泥处理处置中心，和淮安区污水处理厂污泥一起经过压榨后运送到淮安同兴新型建材有限公司进行集中处置。

实验室废液：由淮安市淮安区清源排水有限公司委托淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司收集处理。

格栅栅渣、生活垃圾：环卫清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废气

无组织废气：厂界硫化氢、氨、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准要求。

2、废水

污水处理厂接管废水的 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度均符合接管标准要求；排放废水的 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准要求。

3、噪声

污水处理厂厂界噪声监测点的每天的昼夜等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

五、工程建设对环境的影响

项目污染物排放满足标准要求，周边环境无异常。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目环保设全部建设到位，符合环评及批复要求，废水排放达标，基本符合竣工验收条件。由于废水进水浓度达不到设计要求，装置处理效果在今后运行中检验。

七、后续要求

- 1) 加强污水处理厂的运行管理，做好污泥、实验室废液等固体废物台账记录。
- 2) 做好高噪声设备的维护管理，确保厂界噪声长效稳定达标排放。
- 3) 完善项目突发事件防范和应急设施。
- 4) 政府应加强管网建设，确保废水应收尽收。
- 5) 严格落实排污许可证可要求，定期开展自行监测。

验收成员：

李心宁 殷大岸 高鸿云 郝爱军

淮安市淮安区漕运镇人民政府南闸污水处理厂项目

竣工环境保护自行验收工作组签到表

| | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 电话 | 身份证号码 |
|------|-----|-------------|-------|-------------|--------------------|
| 组长 | 邓仕 | 漕运镇综合执法局 | 局长 | 15851792722 | 320828197103106231 |
| 成员 | 殷大举 | 淮北市环保协会 | | 18915199536 | 340831196704010013 |
| | 胡爱军 | 淮北市节能环保产业协会 | 高工 | 15358695062 | 320811196302211036 |
| | 高鸿飞 | 淮安环科学会 | 高工 | 18061858818 | 320828196310200035 |
| 参会人员 | 杨子亮 | 漕运镇综合行政执法局 | | 18852349922 | 320821198202156417 |
| | 章北立 | 漕运镇综合行政执法局 | | 15770409776 | 320803197007080015 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
